

MARLY INNOVATION CENTER (MIC)

Date de réalisation
Juillet 2018
Fin des travaux
Décembre 2018
Total (arrondi)

0.41 Mio. CHF


Travaux de démolition de 2 citernes 12'000 m3

Maître de l'ouvrage Marly Innovation Center (MIC), Marly

M. Jean-Marc Métrailler - Tél. 079 418 88 44

Ingénieurs CSD Ingénieurs SA, Givisiez

Mme Karine Bourqui - Tél. 079 646 09 35

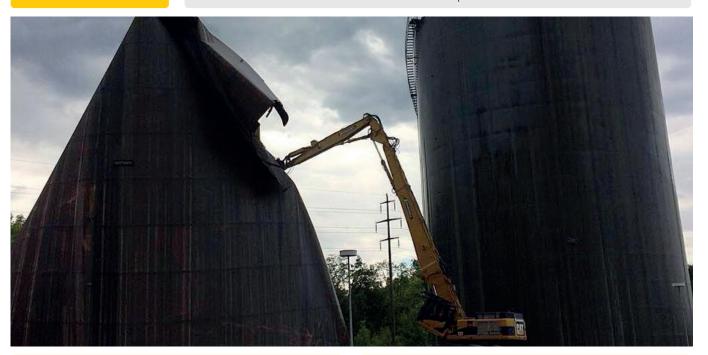

RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE

Chef de secteur
 Responsable de chantier
 Contremaître / Chef d'équipe
 Dean Patterson
 Jusufi Fadil

RÉALISATION DES TRAVAUX

Michel SA (Société du groupe JPF)
100 %

DESCRIPTION DES TRAVAUX PRINCIPAUX

Installation de chantier Aménagement des accès et sécurisation du site

Démolition Démolition des 2 citernes de 12'000 m3 et des infrastructures sous citernes

Dépollution
 Concassage
 Déchets
 Traitement des PCB, grenaillage et élimination des aciers
 Traitement des matériaux de démolition en grave recyclée 0/45
 Tri différencié des matériaux et élimination en décharges appropriées

CONTRAINTES PRINCIPALES

Travaux de déconstruction miticuleux en hauteur avec grand bras

Présence de résidus d'hydrocarbures lors de la démolition, mesures particulières à prendre

/ Travaux sur un site spécialisé nécessitant des contraintes particulières (peintures au plomb, PCB, métaux lourds, etc)

QUANTITÉS PRINCIPALES

Incinérables 22 to Sable non lavé 0-15 110 to


Déchets inertes (DCMI)
 Métaux
 100 to
 Déchets bioactifs
 75 to
 Revêtement (PAK>250g/kg)
 76 to

MARLY INNOVATION CENTER (MIC) / - Déconstruction de citernes







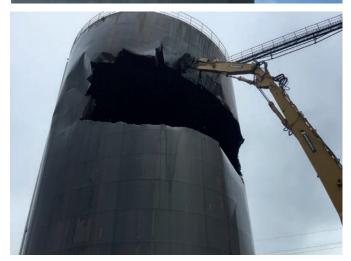

/ MICHEL DÉMOLITION SA



