

Date de réalisation

Août 2024

Fin des travaux

Septembre 2024

Total (arrondi)

38.0 Mille CHF

La Tine - Pont Rose-Marie - Revêtement CFUP

Maître de l'ouvrage

Commune de Rossinière (M. Alain Karnstädt)

026 / 924 37 00

Direction des travaux

Martin ingénieurs civils Sàrl, Château-d'Oex (M. Hervé Martin)

079 / 473 27 82

Spécialiste CFUP

M. Eugen Brühwiler, Prof. Dr. Dipl. Ing. ETH / SIA / IABSE


RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE
Chef de secteur

Jérôme Morel

Responsable de chantier

Jérôme Morel

Contremaître / Chef d'équipe

Claudio Altemeier / Constant Gurtner

RÉALISATION DES TRAVAUX
JPF Construction SA
DESCRIPTION DES TRAVAUX PRINCIPAUX
Couche de protection

Exécution en 2 étapes d'une couche de protection et renforcement sur tablier existant avec CFUP fibré fabriqué « *in situ* », ép. 37mm / Composition Holcim : Ductal®, adjuvants, fibres métalliques
Mise en place de renforts d'armature Ø12mm sur les voutes

Couche de roulement

Pose en 1 étape d'une matrice gravillonnaire pour permettre la circulation sur le CFUP, fabriqué « *in situ* », ép. 15mm / Composition Holcim : gravillons 3/6, Ductal®, fibres synthétiques


CONTRAINTES PRINCIPALES
Fabrication du CFUP « *in situ* » avec malaxeur horizontal, inventaire spécifique et énergies nécessaires
Mise en place du CFUP « *à la main* » et réglage des couches selon épaisseurs prescrites
Respect des temps d'ouvrabilité des matériaux et des étapes nécessaires
QUANTITÉS PRINCIPALES
CFUP fibré

4.2 m³

Matrice gravillonnaire

1.8 m³


LA TINE - PONT ROSE-MARIE / Revêtement CFUP

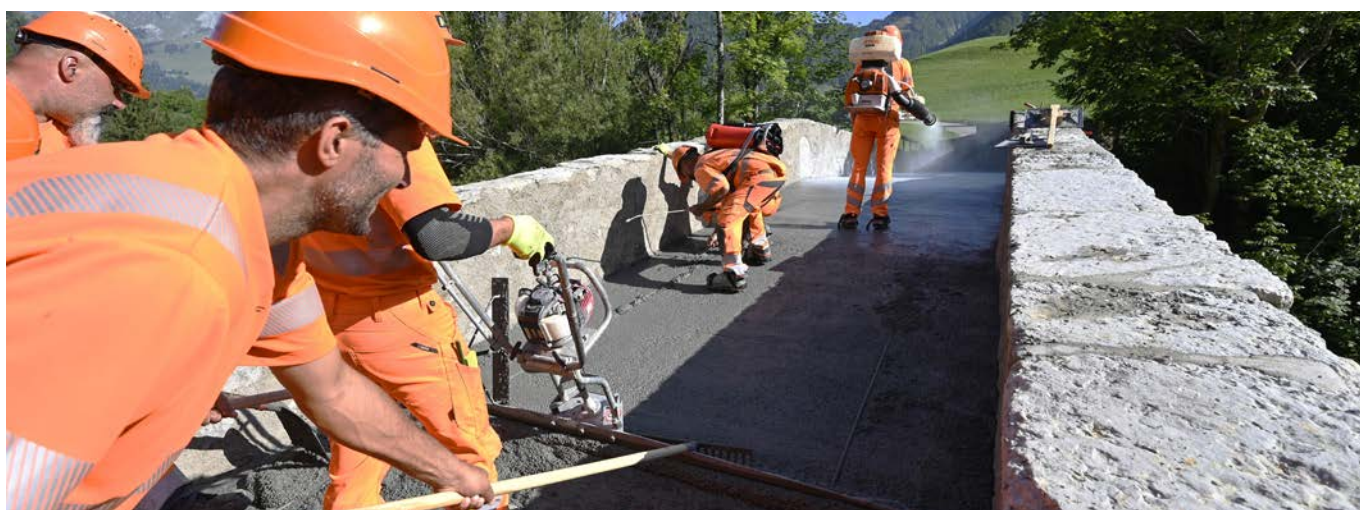

JPF CONSTRUCTION SA

Ch. des Mosseires 65, Case postale, CH-1630 Bulle
Tél. +41 (0)26 919 72 72 - secretariat@jpf.ch - jpf.ch



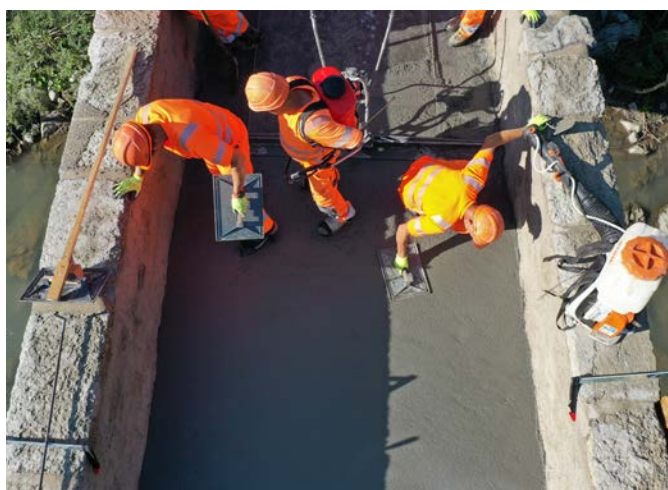

JPF CONSTRUCTION SA

Ch. des Mosseires 65, Case postale, CH-1630 Bulle
Tél. +41 (0)26 919 72 72 - secretariat@jpf.ch - jpf.ch

